


# PLANNING WERKZAAMHEDEN RONDWEG-OOST VEENENDAAL, FASE GROENPOORT

Datum planning: december 2023


## Fase 1 | Grondwerkzaamheden ten behoeve van de wegverduubeling. Periode januari-februari 2024

Verkeer kan zonder hinder gebruik maken van de huidige N233, waarbij de maximumsnelheid is verlaagd naar 50km/uur.

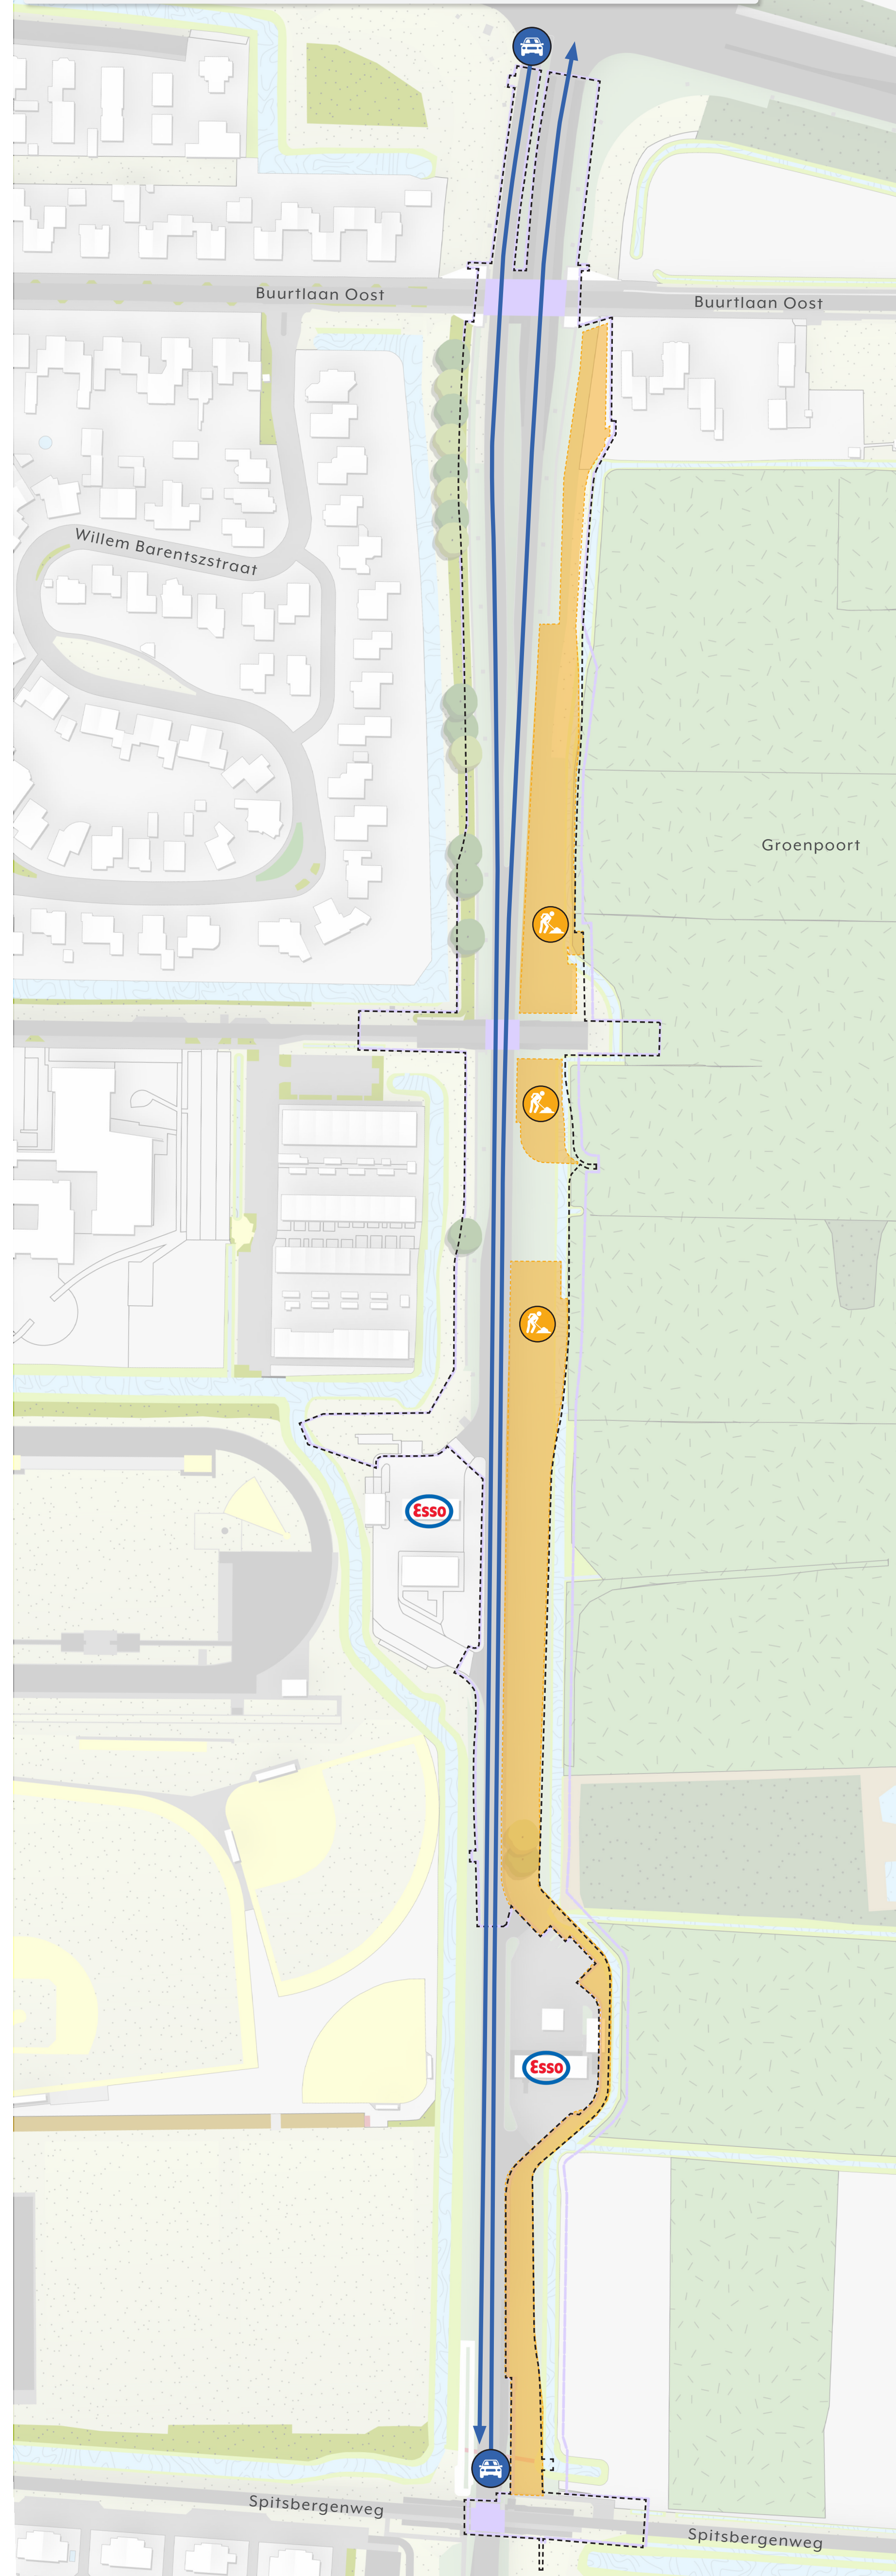


## Fase 2 | Werkzaamheden geluidsscherm Oostzijde, uitbreiding van de fietstunnels en aanleg van de nieuwe rijbaan. Half april-augustus 2024

Verkeer kan zonder hinder gebruik maken van de huidige N233, waarbij de maximumsnelheid is verlaagd naar 50 km/uur.

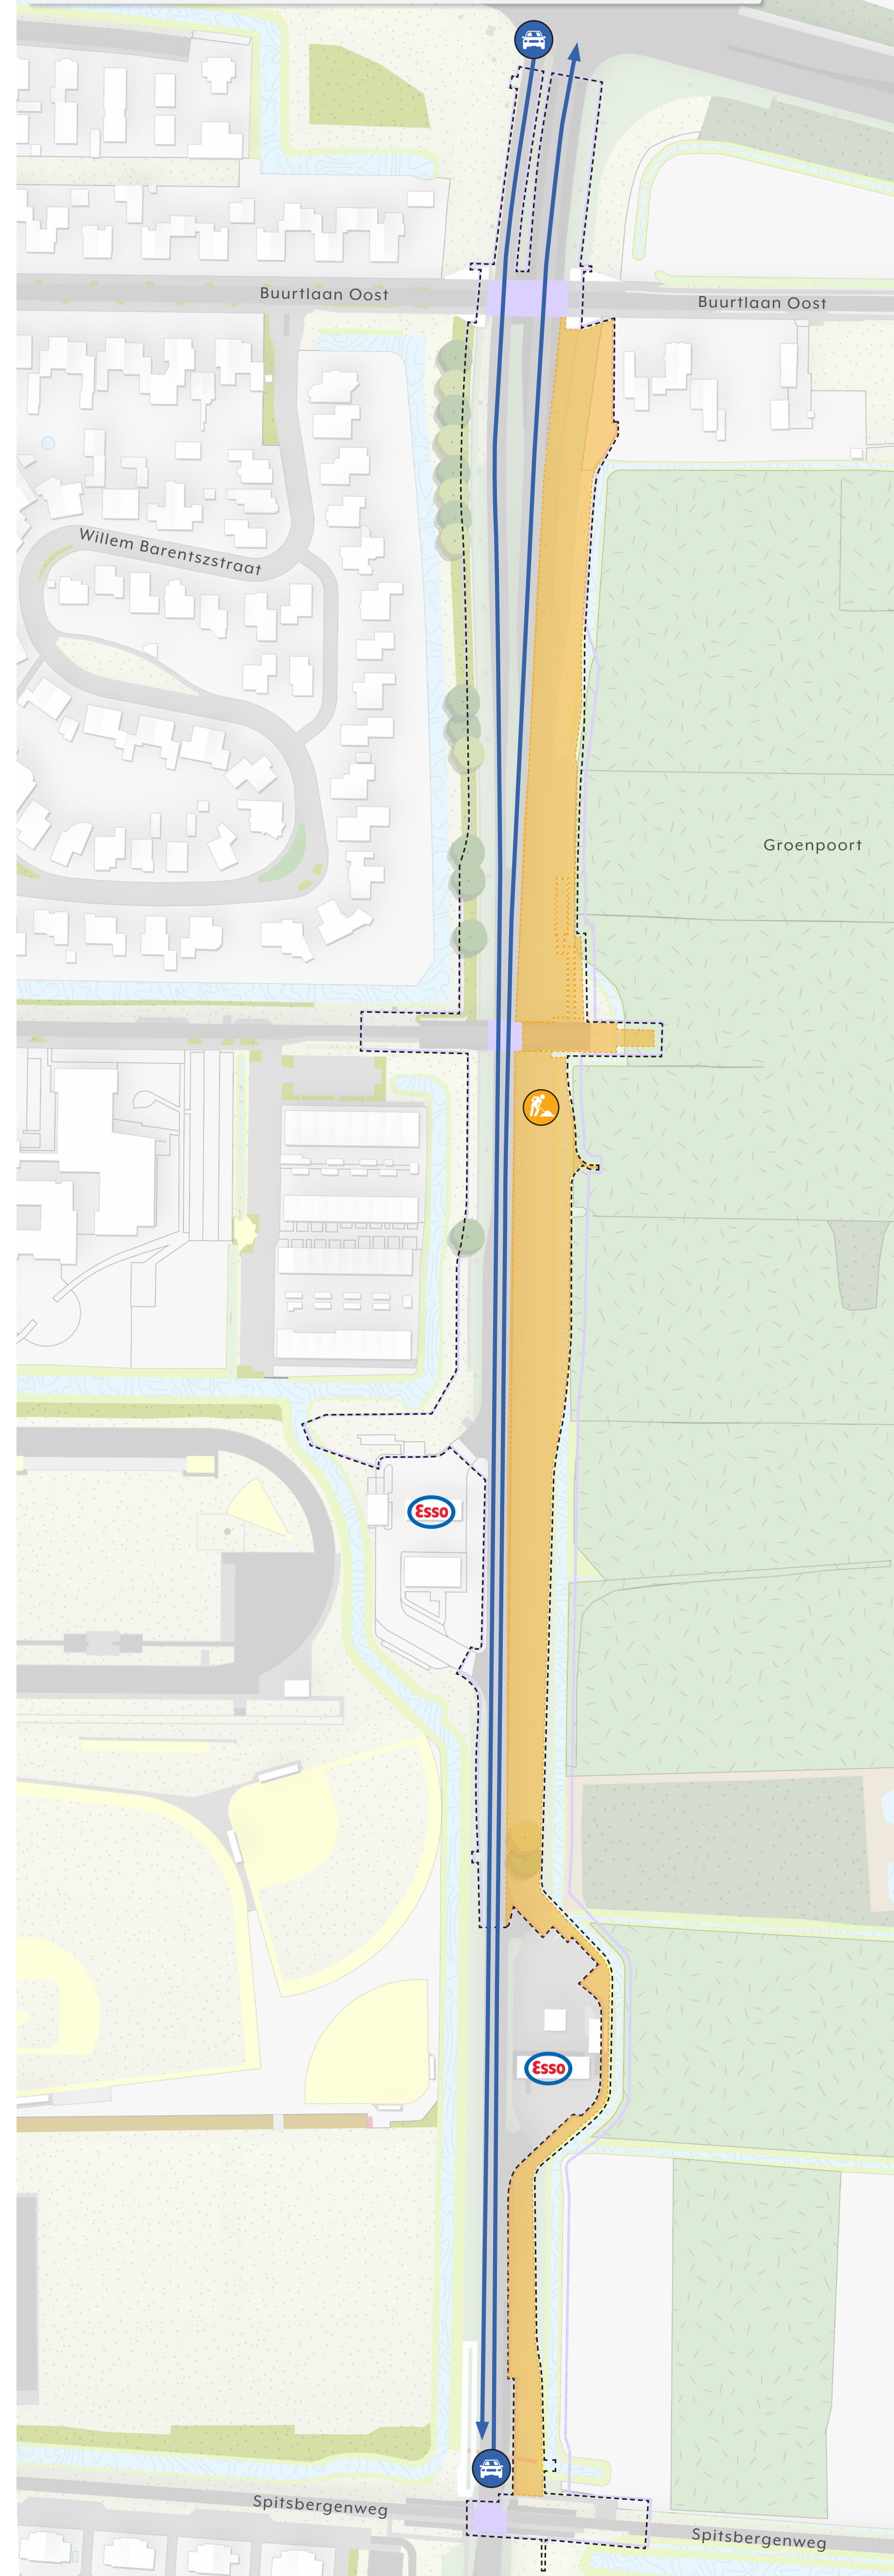

## Fase 3 | Werkzaamheden geluidsscherm Westzijde en vervanging huidige rijbaan. Half september-november 2024

Het verkeer maakt voor beide richtingen gebruik van de nieuwe rijbaan waarbij de maximumsnelheid is verlaagd naar 50 km/uur.

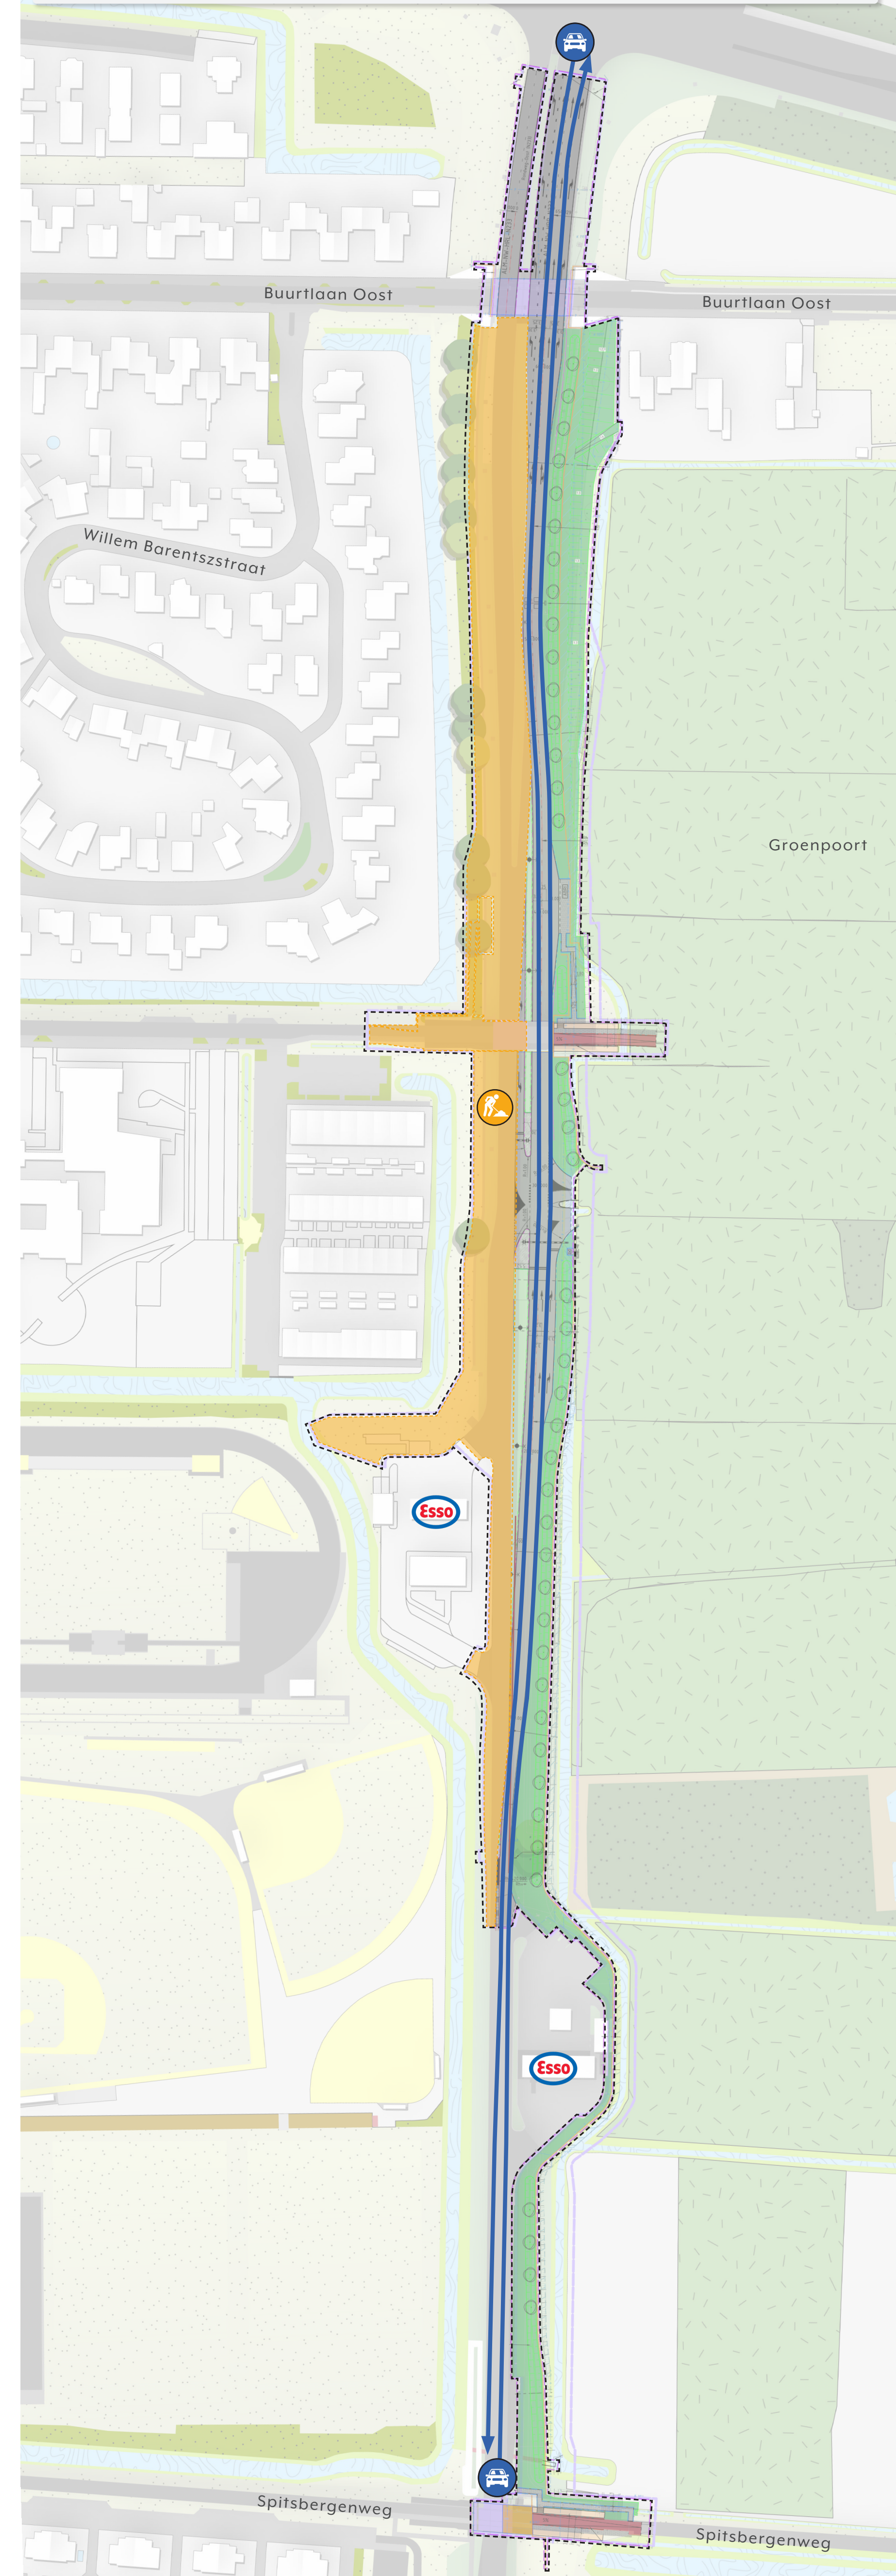

## Fase 4 | Afrondende werkzaamheden en aanplant van het groen over het gehele traject. december 2024 - voorjaar 2025.

Verkeer maakt in beide richtingen gebruik van de nieuwe, verbrede weg waar een maximumsnelheid geldt van 70 km/uur.

